


Bauphase	Baupermin
BP6	23.01.29 bis 15.02.29

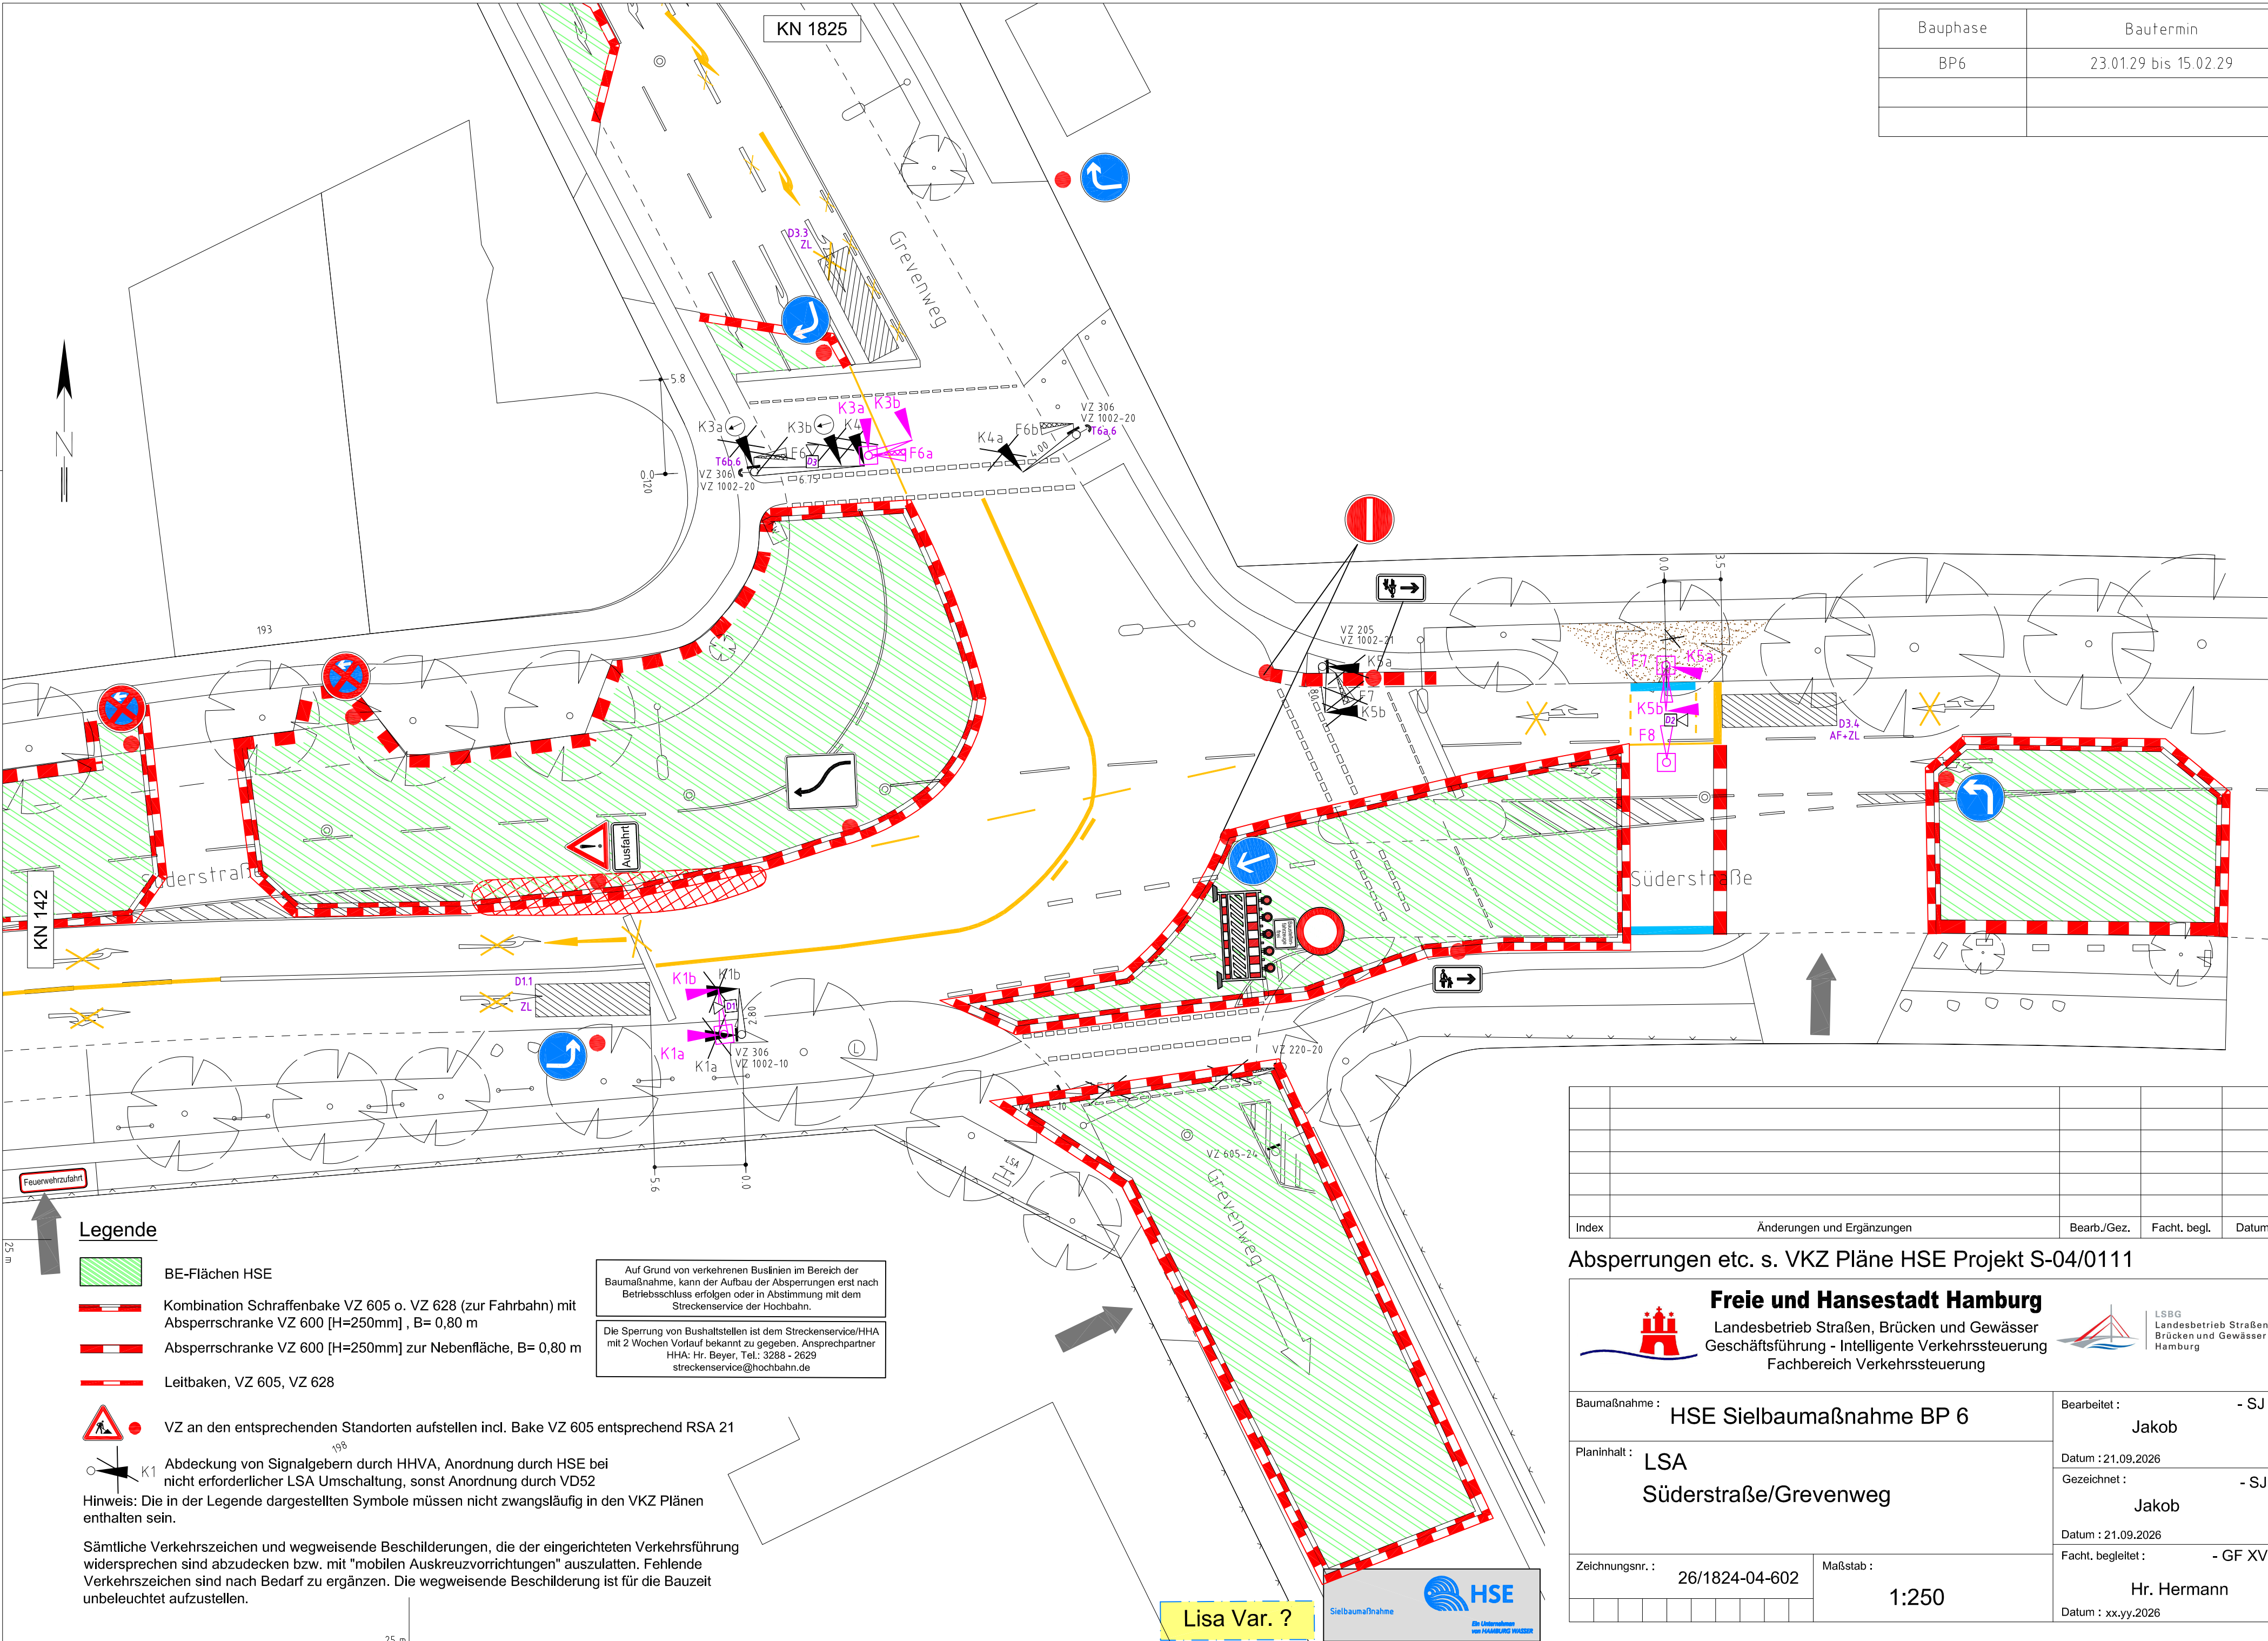

Legende

- BE-Flächen HSE
 - Kombination Schraffenbake VZ 605 o. VZ 628 (zur Fahrbahn) mit Absperrschranke VZ 600 [H=250mm] , B= 0,80 m
 - Absperrschranke VZ 600 [H=250mm] zur Nebenfläche, B= 0,80 m
 - Leitbaken, VZ 605, VZ 628
 - VZ an den entsprechenden Standorten aufstellen incl. Bake VZ 605 entsprechend RSA 21
 - Abdeckung von Signalgebern durch HHVA, Anordnung durch HSE bei nicht erforderlicher LSA Umschaltung, sonst Anordnung durch VD52
- Hinweis: Die in der Legende dargestellten Symbole müssen nicht zwangsläufig in den VKZ Plänen enthalten sein.
- Sämtliche Verkehrszeichen und wegweisende Beschilderungen, die der eingerichteten Verkehrsführung widersprechen sind abzudecken bzw. mit "mobilen Auskreuzvorrichtungen" auszulaten. Fehlende Verkehrszeichen sind nach Bedarf zu ergänzen. Die wegweisende Beschilderung ist für die Bauzeit unbeleuchtet aufzustellen.

Auf Grund von verkehrten Buslinien im Bereich der Baumaßnahme, kann der Aufbau der Absperrungen erst nach Betriebsschluss erfolgen oder in Abstimmung mit dem Streckenservice der Hochbahn.

Die Sperrung von Bushaltestellen ist dem Streckenservice/HHA mit 2 Wochen Vorlauf bekannt zu geben. Ansprechpartner HHA: Hr. Beyer, Tel.: 3288 - 2829 streckenservice@hochbahn.de

Lisa Var. ?

Index	Änderungen und Ergänzungen	Bearb./Gez.	Facht. begl.	Datum	

Absperrungen etc. s. VKZ Pläne HSE Projekt S-04/0111



Freie und Hansestadt Hamburg
Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer
Geschäftsführung - Intelligente Verkehrssteuerung
Fachbereich Verkehrssteuerung



Baumaßnahme : HSE Sielbaumaßnahme BP 6	Bearbeitet : Jakob Datum : 21.09.2026
Planinhalt : LSA Süderstraße/Grevenweg	Gezeichnet : Jakob Datum : 21.09.2026
Zeichnungsnr. : 26/1824-04-602	Facht. begleitet : Hr. Hermann Datum : xx.yy.2026

Maßstab :
1:250
