

Legende

- BE-Flächen HSE
- Kombination Schraffenbake VZ 605 o. VZ 628 (zur Fahrbahn) mit Absperrschranke VZ 600 [H=250mm] , B= 0,80 m
- Absperrschranke VZ 600 [H=250mm] zur Nebenfläche, B= 0,80 m
- Leitbaken, VZ 605, VZ 628 B= 0,50 m
- VZ an den entsprechenden Standorten aufstellen incl. Bake VZ 605 entsprechend RSA 21
- provisorische LSA mit Fundament (~1,20/1,20m)

Hinweis: Die in der Legende dargestellten Symbole müssen nicht zwangsläufig in den VKZ Plänen enthalten sein.


Sämtliche Verkehrszeichen und wegweisende Beschilderungen, die der eingerichteten Verkehrsführung widersprechen sind abzudecken bzw. mit "mobilen Auskreuzvorrichtungen" auszulatten. Fehlende Verkehrszeichen sind nach Bedarf zu ergänzen. Die wegweisende Beschilderung ist für die Bauzeit unbeleuchtet aufzustellen.

Findling

Haltverbotsschilder
4 Tage vor
Baustellenbeginn
aufstellen

Vorh. VZ zum
Kreisverkehr
abdecken.

Verfasst:




SCHMECK·JUNKER
Ingenieurgesellschaft mbH

Erschließung
Verkehrstechnik
Straßenplanung
Bauüberwachung
Projektkoordination
Leistungstrassenplanung

Gotenstraße 14 - 20097 Hamburg Tel.: 040-696 525-0 Fax: -99 post@schmeck-junker.de

Projekt:
2031b
Bearbeitet:
Jakob
Gezeichnet:
Kaeming
Datum:
18.02.2026

Die für die provisorische LSA erforderliche Stromversorgung ist durch die Signalbaufirma bzw. die Absperrfirma herzustellen und beim örtlichen Versorgungsunternehmen zu beantragen.

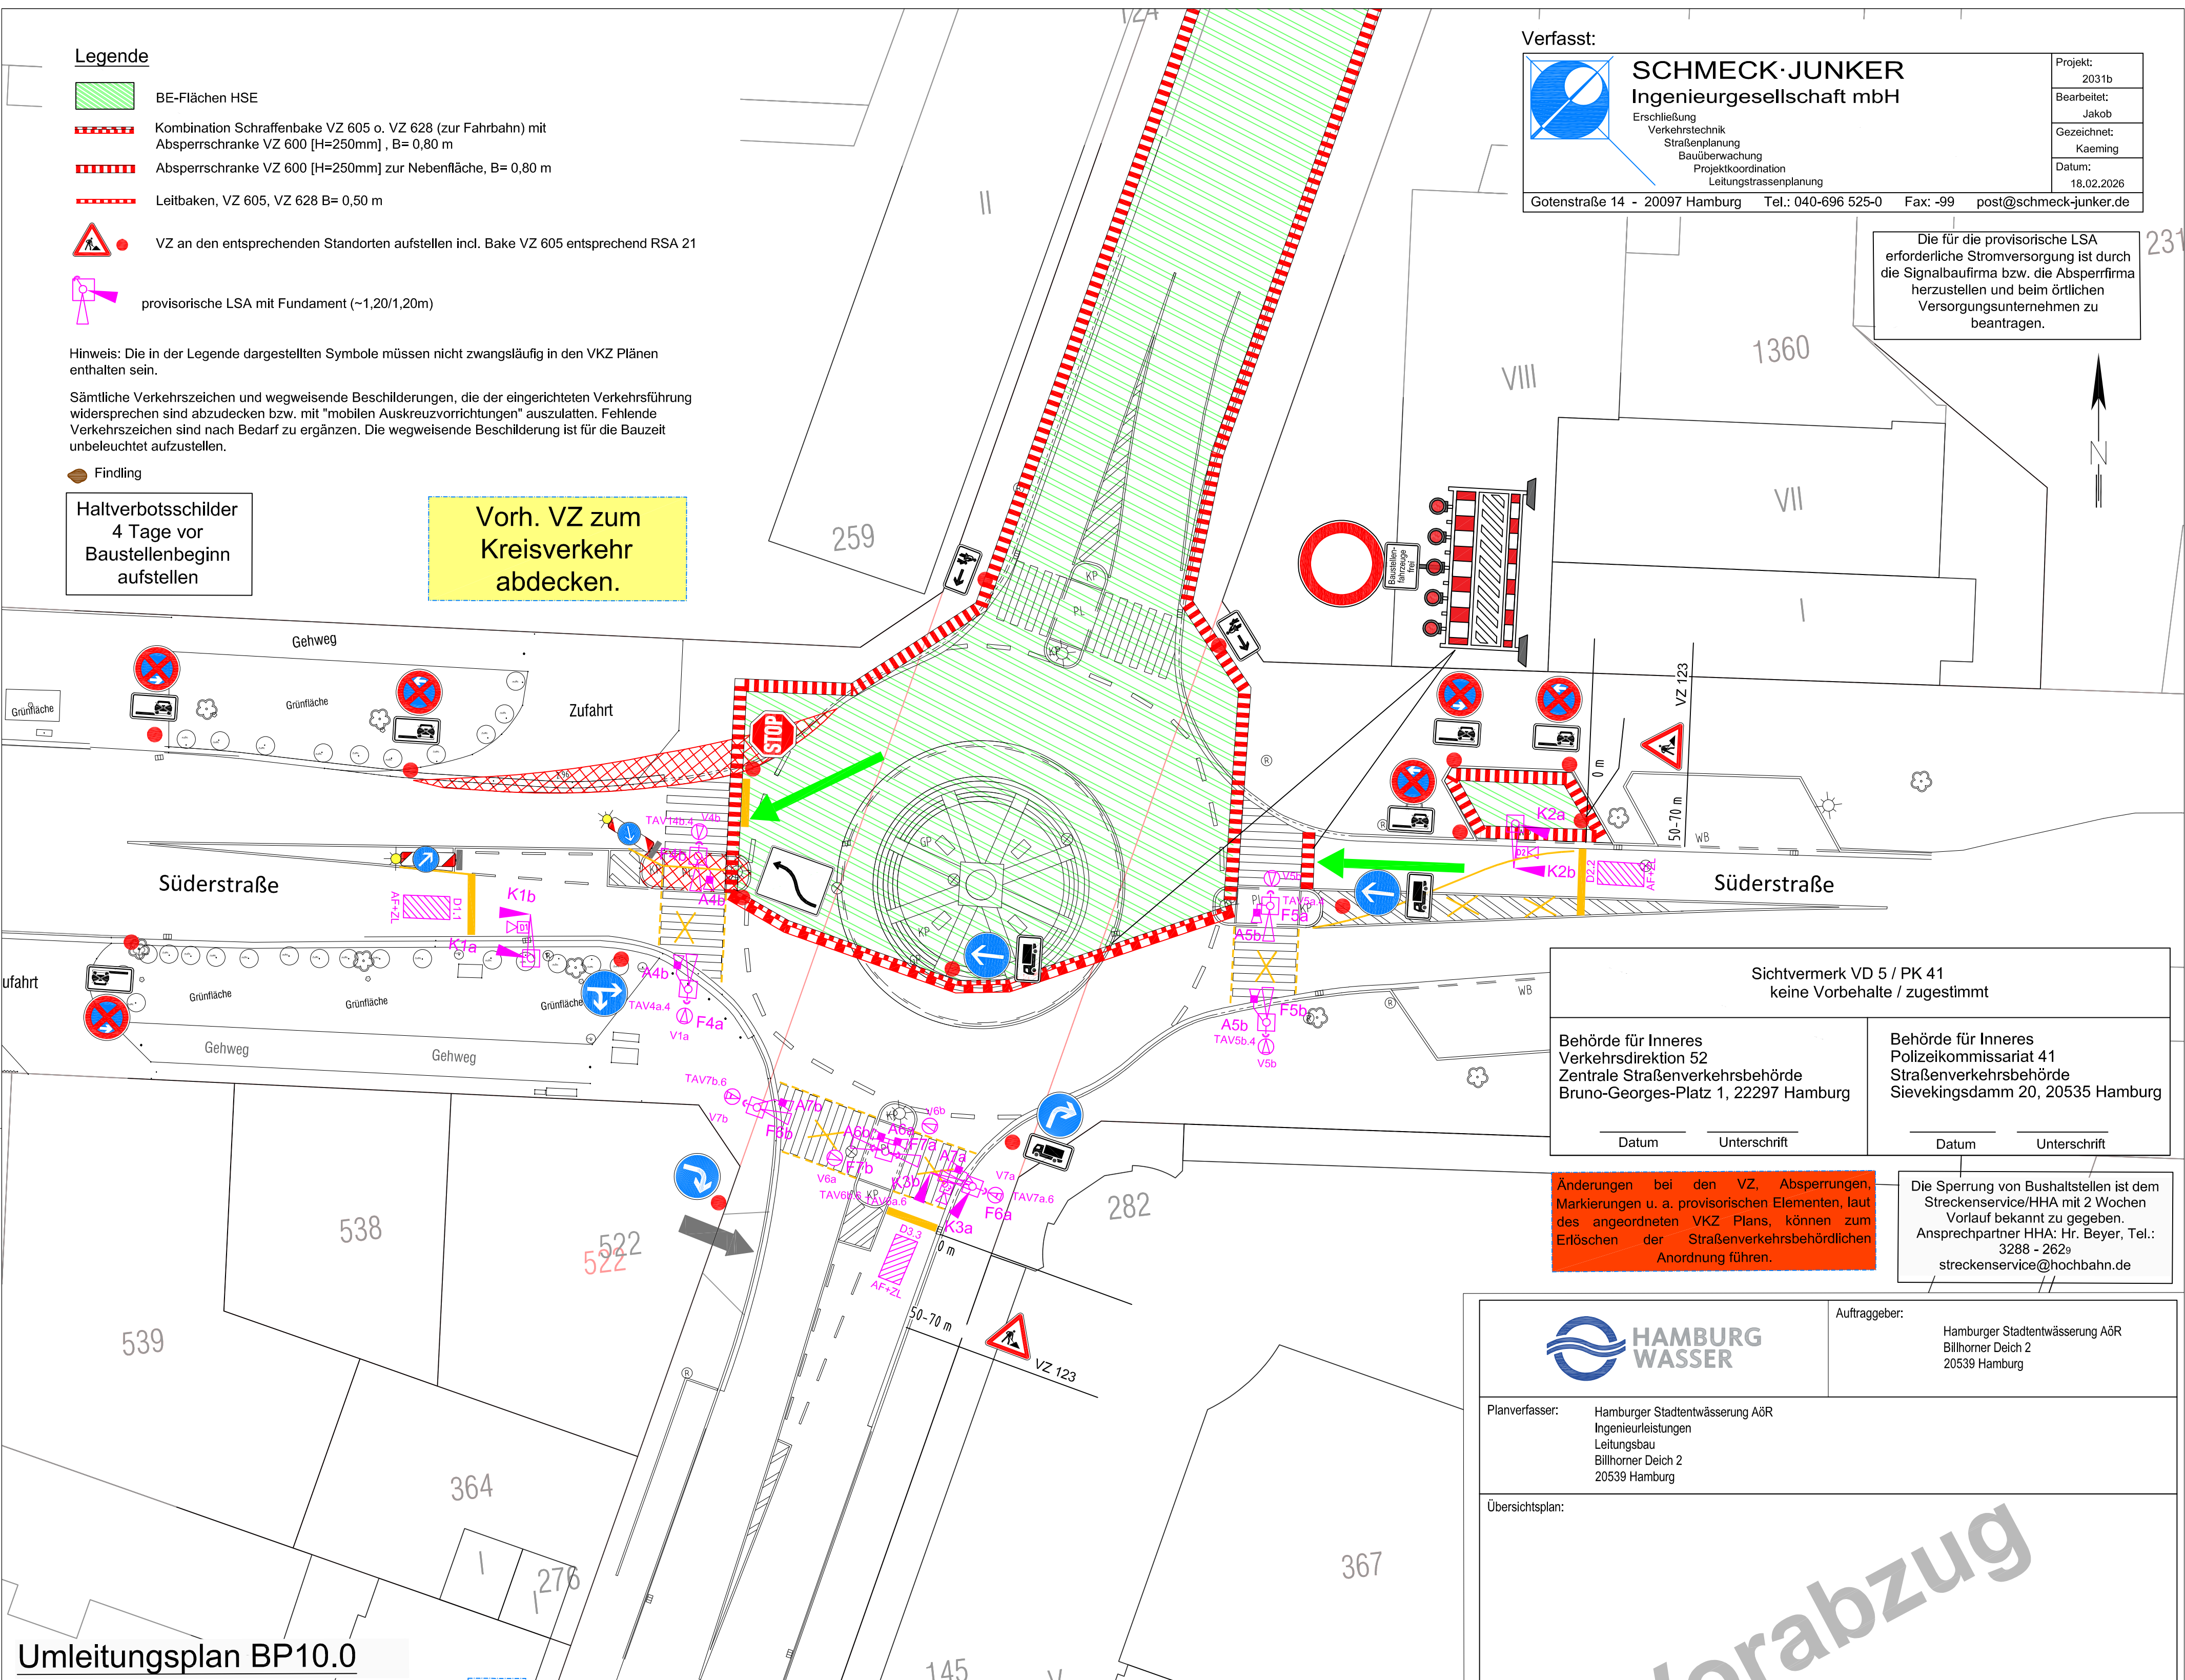

Sichtvermerk VD 5 / PK 41
keine Vorbehalte / zugestimmt

Behörde für Inneres
Verkehrsdirektion 52
Zentrale Straßenverkehrsbehörde
Bruno-Georges-Platz 1, 22297 Hamburg

Behörde für Inneres
Polizeikommissariat 41
Straßenverkehrsbehörde
Sievekingsdamm 20, 20535 Hamburg

Änderungen bei den VZ, Absperrungen, Markierungen u. a. provisorischen Elementen, laut des angeordneten VKZ Plans, können zum Erlöschen der Straßenverkehrsbehördlichen Anordnung führen.

Die Sperrung von Bushaltstellen ist dem Streckenservice/HHA mit 2 Wochen Vorlauf bekannt zu gegeben.
Ansprechpartner HHA: Hr. Beyer, Tel.: 3288 - 2629
streckenservice@hochbahn.de





Auftraggeber:
Hamburger Stadtentwässerung AöR
Billhomer Deich 2
20539 Hamburg

Planverfasser:
Hamburger Stadtentwässerung AöR
Ingenieurleistungen
Leitungsbau
Billhomer Deich 2
20539 Hamburg

Übersichtsplan:

Vorabzug

Umleitungsplan BP10.0

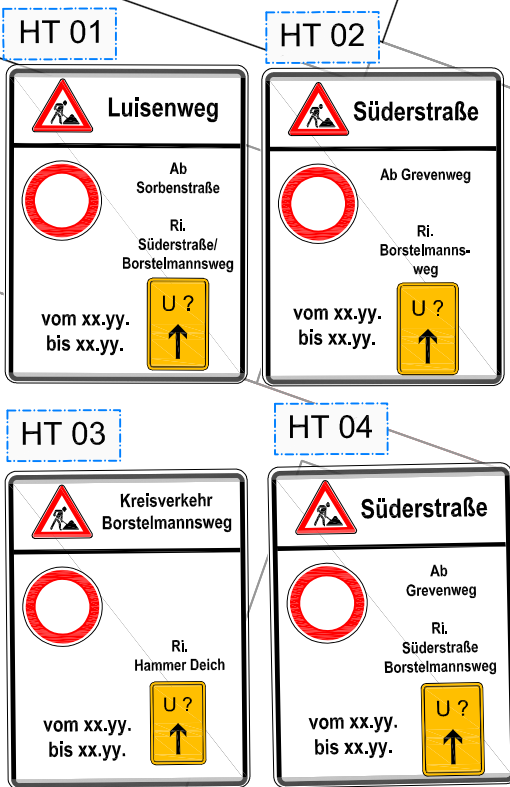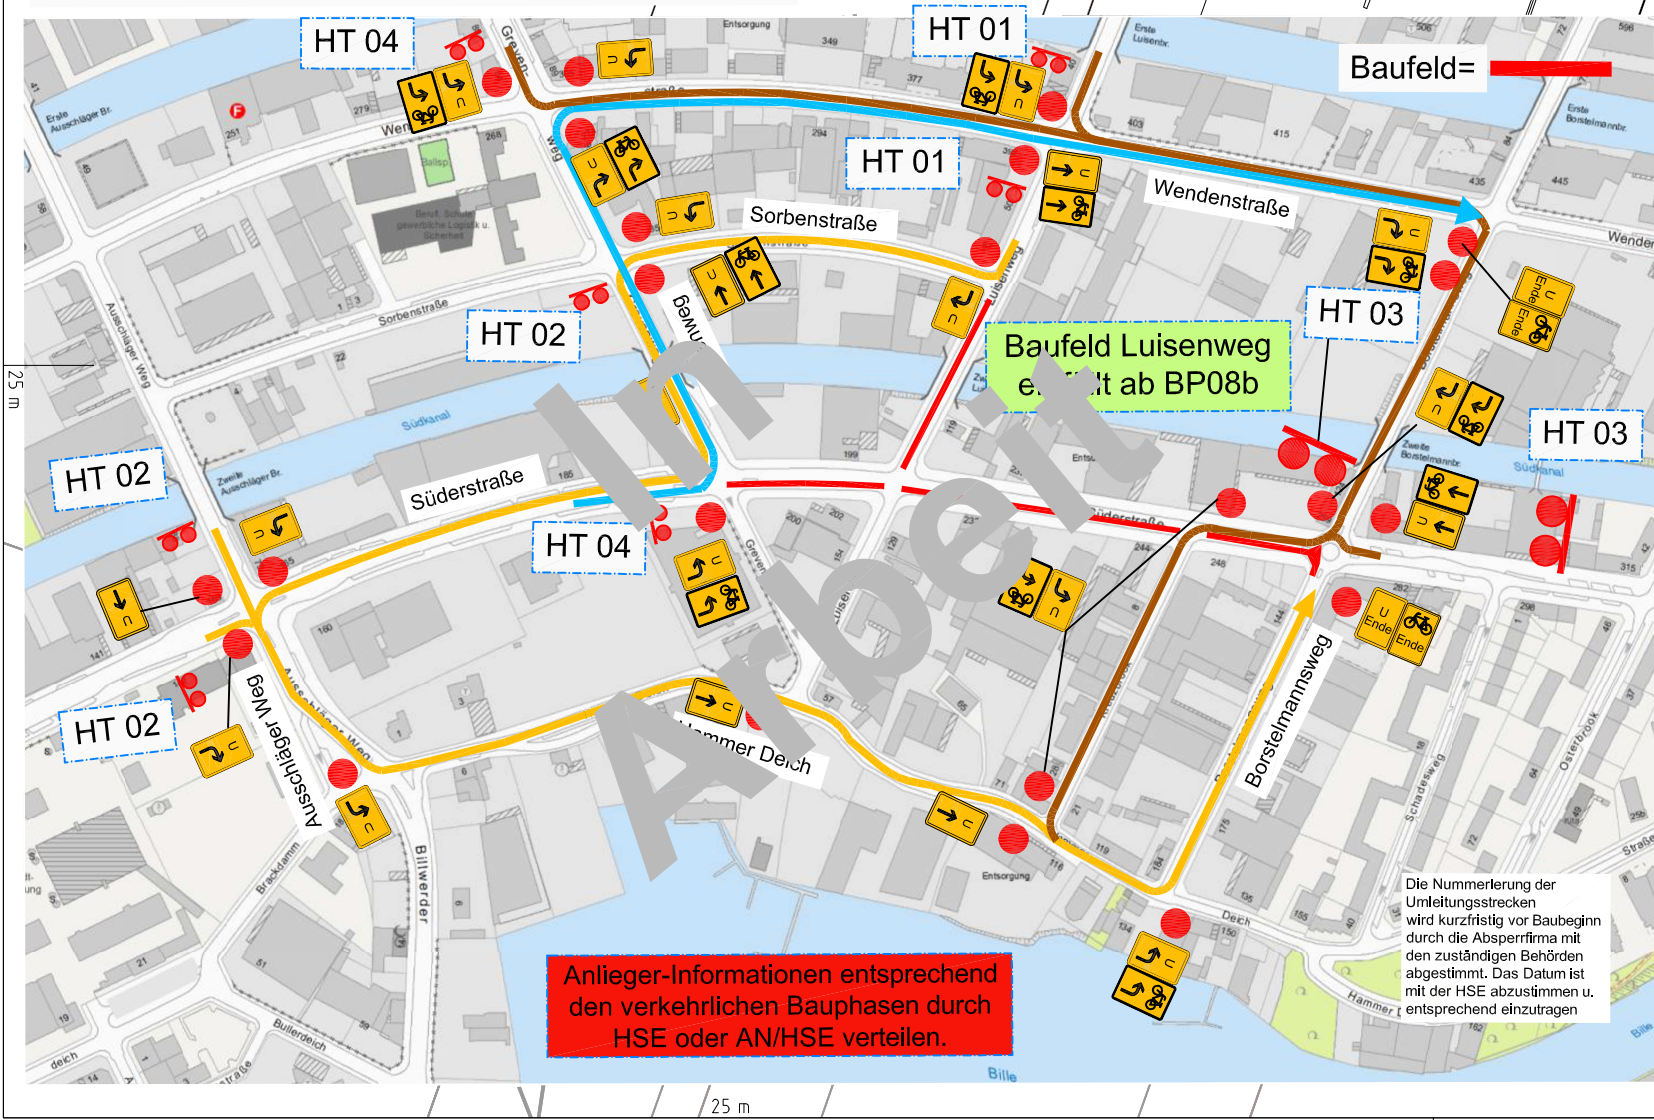

geplanter Bautermin
BP10.0
(25.02.-04.11.2030)

Lisa Var. 3

Gezeichnet:	SJ Kaeming	Datum:	17.02.2026	Fachtechnisch geprüft:		Datum:	
Bearbeitet:	SJ Jakob	Datum:	17.02.2026	Betrieblich Einverstanden:		Datum:	
Datentechnisch geprüft:		Datum:					
Projektbezeichnung:	Süderstraße						
Stadtteil:	Hamburg - Hammerbrook						
Planinhalt:	VKZ Süderstraße Bauphase 10.0 LSA Süderstraße/Borstelmannsweg 29/5970-04-200						
Maßstab	1 : 500						
Projektnummer:	S-04/0111			DMS-ID:			
Plannummer:	3 von 3			Konto / Anlass:			
Planungsstand:	ENTWURF						Index:
